



**Junta de
Freguesia
de São
Salvador**

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geral@freguesiassalva
dor.pt
+(351) 234 321725

NIPC: 510833217

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2024

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro para 2024, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Numa elaboração do último relatório de execução, a Junta de Freguesia de São Salvador, apresenta um balanço dos trabalhos realizados durante todo o corrente ano de 2024.

Um trabalho contínuo, desenvolvido pela JFSS apoiado sempre em responsabilidade, rigor, transparência e dinamismo nas principais áreas de atuação e intervenção na Freguesia de São Salvador.

Sempre com uma parceria ativa e coordenada com o Município de Ílhavo ao longo do ano 2024 primou-se com dedicação e empenho na execução dos objetivos propostos com toda a comunidade e sempre com o objetivo de alcançar um crescendo ativo na qualidade de vida da nossa Comunidade, Freguesia e Município.

Ponto 2. Neste ponto dois apresentamos destacamos a listagem dos trabalhos em compromisso assumidos pela Junta de Freguesia de São Salvador:

Obra	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Substituição da cobertura do Terrado do Mercado de Ílhavo	30 000,00 €	5 400,00 €	18%	24 600,00 €	82%
Reabilitação do Campo de Jogos do Parque da Capela da Carvalheira	14 000,00 €	6 750,00 €	48%	7 250,00 €	52%
Construção de cobertura com lonas/ velas sobre a área de restauração do recinto da Feira dos 13 - Murteira	30 000,00 €	12 518,00 €	42%	17 482,00 €	58%
Construção de ramal de eletricidade para o recinto da Feira dos 13 - Murteira	13 000,00 €	8 000,00 €	62%	5 000,00 €	38%
Manutenção de Parques de Lazer	6 000,00 €	3 500,00 €	58%	2 500,00 €	42%
Manutenção de Caminhos - Nivelamento e Reposição de Pisos	6 000,00 €	0,00 €	0%	6 000,00 €	100%
Recuperação do percurso pedestre entre a Barquinha e a Vista Alegre	45 000,00 €	15 000,00 €	33%	30 000,00 €	67%
Proteção das margens da Ria	3 000,00 €	0,00 €	0%	3 000,00 €	100%
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas	4 000,00 €	0,00 €	0%	4 000,00 €	100%
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia	10 000,00 €	5 000,00 €	50%	5 000,00 €	50%
Construção de Passeios	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	2 500,00 €	0,00 €	0%	2 500,00 €	100%
Total	168 500,00 €	56 168,00 €	33%	112 332,00 €	67%
Valor Complementar:					
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	173 500,00 €	56 168,00 €	32%	117 332,00 €	68%

a) Numa última análise dos objetivos em compromisso até final de 2024 salientamos a realização de trabalhos urgentes e continuados durante todo o ano 2024 (intervenções diversas e diárias em esgotos, águas pluviais, hidráulica, limpezas, etc.) e os outros de compromisso específico que foram executados e terminados nem datas específicas conforme o fornecimento de materiais, mão de obra específica e adjudicações externas.

Seguidamente, através de uma verificação/análise mais afincada e final do nosso compromisso, apresentamos a listagem de trabalhos e desafios assumidos por esta Junta de Freguesia durante 2024 podendo todo o desenrolar de ações ser consultado através da análise pormenorizada e ilustrada nos relatórios anteriores e atempadamente enviados para análise da CMI durante 2024.

b) Mais uma vez, denotando todo o trabalho realizado, referenciamos a transição da empreitada da requalificação do Mercado de Ílhavo para o primeiro trimestre de 2025 fruto das más condições climatéricas do final de 2024.

A obra concluída ao presente momento encontra-se concluída acompanhando este relatório a fatura correspondente ao executado no local.

Relativamente ao compromisso desta Junta de Freguesia na obra de Eletrificação do Recinto da Feira dos 13 o processo encontra-se ainda pendente e em análise pelas entidades legais (E-REDES) aguardando esta Junta de Freguesia a conclusão do processo para execução/finalização da obra o mais rapidamente possível.

Destaca-se ao momento a realização de parte das estruturas para implementação de equipamentos e elaboração do estudo/projeto eletrotécnico.

Contudo, aguarda esta Junta de Freguesia ansiosamente os pareceres legais da entidade competente para conclusão da tão esperada obra que será certamente uma mais-valia a este espaço e à Freguesia.

Continuaremos a primar por uma responsabilidade ativa, transparência, coerência e rigor que continuará a ser a pedra basilar quer do desempenho deste executivo, quer na redação de todos os documentos que produz.

Este trabalho somente possível a partir do contributo consistente, contínuo, ativo e permanente de todos os nossos recursos humanos e executivo, que diariamente se entregam a um exercício de funções dedicado que possibilita e efetiva estes excelentes resultados.

Prosseguiremos, convictamente, a zelar pelo melhor da nossa comunidade, honrando o compromisso assumido, tendo por base a partilha e a proximidade ativa com todos os fregueses, que tanto nos caracteriza.

Salvaguardamos também o trabalho acrescido/investimentos adicionais assumidos com verbas da Junta de Freguesia nunca esquecendo todo o tipo de intervenções realizadas nas vias de circulação no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada

com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio.

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Cobertura do Mercado de Ílhavo					
Trabalhos Específicos	Remoção de telhas degradadas			Concluído	
	Verificação de estrutura			Concluído	
	Recuperação de estruturas de ferro			Concluído	
	Pintura de estruturas			Concluído	
	Aplicação de noca cobertura em policarbonato			Concluído	
Parque da Ermida /Carvalheira					
Trabalhos Específicos	Limpeza do Espaço	4 de março	12 de março	Concluído	
	Construção e aplicação de calçada	13 de março	19 de março	Concluído	
	Lavagem/ limpeza do campo de futebol	22 de março	29 de março	Concluído	
	Pintura de paredes do campo	1 de abril	5 de abril	Concluído	
	Aplicação de redes e portões	8 de abril	11 de abril	Concluído	
	Pintura do piso	13 de abril	17 de abril	Concluído	
Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Manutenção dos Caminhos					
Trabalhos Específicos	Nivelamento	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de ABGE (Tout-Venant)	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Baixada de energia Feira dos 13					
Trabalhos Específicos	Preparação de estruturas de receção				Por concluir por motivos alheios à JFSS
	Aplicação de equipamentos				

Cobertura de zona de refeições feira dos 13					
Trabalhos Específicos	Preparação de estruturas de receção	1 de outubro	8 de outubro	Concluído	
	Aplicação de equipamentos técnicos/tenda	7 de outubro	10 de outubro	Concluído	
	Cobertura técnica	14 de outubro	24 de outubro	Concluído	
Proteção Margens da Ria					
Trabalhos Específicos	Reposição e acomodação de pedra e derivados	6 de maio	10 de maio	Concluído	
	Renovação de pedra	6 de maio	21 de maio	Concluído	
	Manutenção	6 de maio	31 de dezembro	Concluído	
Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Pavimentação de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Secções Depósito Resíduos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Computação de pisos	2 de maio	29 de maio	Concluído	
	Aplicação de Tout Venant e pó de pedra	2 de maio	29 de maio	Concluído	
	Construção de estruturas	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Substituição Janelas da Sede	17 de junho	20 de junho	Concluído	
	Renovação do espaço do mercado do peixe	24 de junho	25 de julho	Concluído	
Construção Passeios					
Trabalhos Específicos	Nivelamento de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de lancil	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de pavê	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
	Plantação de novas árvores	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Manutenções de caldeira	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Podar, aparar e cortar	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos Específicos	Piso Cimento	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso Areia	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso pavê	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Construção de estrutura de apoio	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
	Plantação de novas arvores	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Manutenções de caldeira	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Poda, apare e corte	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos Específicos	Piso Cimento	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso Areia	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso pavê	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Construção de estrutura de apoio	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
Construção do Eco Trilho da Barquinha e Passadiço de madeira					
Trabalhos Específicos	Abertura e limpeza e caminhos	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Remoção de lixos e vegetação	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Construção de caminho	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Implementação e construção de passadiço	A avaliar novo apoio nos contratos inter 2025 para aquisição da estrutura.			

Ponto 3. Além da dos prazos previstos indicação, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra		Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento PrevistoJunta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Cobertura do Mercado de Ílhavo			30 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Remoção de telhas degradadas		29 999,70 €	29 999,70 €	5 400,00 €	24 600,00 €
	Verificação de estrutura					
	Recuperação de estruturas de ferro					
	Pintura de estruturas					
	Aplicação de noca cobertura em policarbonato					
TOTAIS PARCIAIS			29 999,70 €	29 999,70 €	N.A.	N.A.
Parque da Ermida /Carvalheira/ Outros Parques			14 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Limpeza do Espaço direcionados a obra			1 238,66 €	6 750,00 €	7 250,00 €
	Construção e aplicação de calçada			1 930,83 €		
	Limpeza/ Custos			1 436,13 €		
	Pintura de paredes do campo			2 516,38 €		
	Aplicação de redes e portões			421,72 €		
	Pintura do piso			1 454,59 €		
	Piso para aplicação de máquinas de desporto			372,68 €		
	Preparação de piso parque infantil			190,15 €		
	Parque Infantil/desportivo			4 435,52 €		
	Estilha para parque			779,89 €		
	Mão de Obra operacionais			2 003,40 €		
	Acessórios de trabalho			397,96 €		
	Manutenção de Equipamentos			2 398,81 €		
	TOTAIS PARCIAIS			0,00 €		
Manutenção de caminhos			6 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Nivelamento			0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
	Aplicação de ABGE (Tout-Venant)			2 374,37 €		
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant			1 371,33 €		
	Mão de Obra operacionais/Combustíveis			3 211,02 €		
	Manutenção de Equipamentos			2 180,93 €		
TOTAIS PARCIAIS			0,00 €	9 137,65 €	N.A.	N.A.
Baixada de energia Feira dos 13			13 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Preparação de estruturas de receção			271,57 €	8 000,00 €	5 000,00 €
	Aplicação de equipamentos /mão de obra			333,90 €		
TOTAIS PARCIAIS			0,00 €	605,47 €	N.A.	N.A.
Cobertura de zona de refeições feira dos 13			30 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Preparação de estruturas de receção			3 548,51 €	12 518,00 €	17 482,00 €
	Cobertura técnica			42 177,40 €		
	Armadura de Ferro fundações			1 014,38 €		
	Mao de Obra /combustíveis			1 809,57 €		
	Manutenção de Equipamentos			643,79 €		
TOTAIS PARCIAIS			0,00 €	49 193,65 €	N.A.	N.A.

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Proteção Margens da Ria		3 000,00 €	-	-	-
	Reposição e acomodação de pedra e derivados		0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
	Renovação de pedra		0,00 €		
	Mão de obra/ Combustíveis		2 849,97 €		
	Manutenção de equipamentos		756,90 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	3 606,87 €	N.A.	N.A.
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética		4 000,00 €	-	-	-
	Construção de canaletas de águas pluviais		281,42 €	0,00 €	4 000,00 €
	Retificação e reposição de tampas		929,88 €		
	Materiais diversol /consumíveis		1 058,29 €		
	Espelho		175,78 €		
	Mão de Obra		2 471,87 €		
	Sinalética		2 597,73 €		
	Manutenção de equipamentos / aquisição		817,79 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	8 332,76 €	N.A.	N.A.
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia		10 000,00 €	-	-	-
	Pavimentação de pisos		3 190,13 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Manutenções diversas		1 357,18 €		
	Ornamentação Cemitério		44,80 €		
	Construção/Aplicação de estruturas Cemitério e Parques		578,10 €		
	Tintas		466,13 €		
	Mão de obra/Combustíveis		2 308,42 €		
	Outras estruturas		7 370,79 €		
	Mercado - Sala do Peixe		294,00 €		
	Mercado Sala 14		2 871,54 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	18 481,09 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios		5 000,00 €	-	-	-
	Mão de Obra		1 803,06 €	0,00 €	5 000,00 €
	Materiais		4 029,38 €		
	Combustíveis		685,18 €		
	Manutenção de equipamentos / aquisição		122,42 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	6 640,04 €	N.A.	N.A.
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira		2 500,00 €	-	-	-
	Aplicação de árvores caldeira		1 446,79 €	0,00 €	2 500,00 €
	Equipamento técnico		267,95 €		
	Manutenção de equipamentos / aquisição		1 211,80 €		
	Mão de Obra		400,68 €		
TOTAIS PARCIAIS			3 327,22 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos		5 000,00 €	-	-	-
	Cimento		1 177,96 €	0,00 €	5 000,00 €
	Areia		1 136,52 €		
	Mão de obra operacionais		2 203,74 €		
	Combustíveis		252,46 €		
	Sinalética		276,75 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	5 047,43 €	N.A.	N.A.
Recuperação Percorso Pedestre Barquinha e Passadiço		45 000,00 €	-	-	-
	Mão de obra operacionais		2 504,25 €	15 000,00 €	30 000,00 €
	Combustíveis		2 152,13 €		
	Serviços de terraplanagem		7 527,76 €		
	Material de compactação		11 373,33 €		
	Manutenção de Equipamentos		1 509,30 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	25 066,77 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Parques		6 000,00 €	-	-	-
	Manutenção Equipamentos técnicos		5 395,72 €	3 500,00 €	2 500,00 €
	Acessórios de parques		2 547,26 €		
	Mão de Obra / Combustíveis		3 271,28 €		
	Manutenção e subs. de madeiras		1 719,59 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	12 933,85 €		
TOTAIS PARCIAIS		173 500,00 €	191 949,22 €		

Ponto 4. No ponto em causa, não há nada a referir, uma vez que foram intervencionadas em 2024, já tendo sido informadas todas a intervenções no relatório de dezembro de 2024.

Ponto 5. No ponto cinco, destacamos a realização dos trabalhos previamente propostos salientado sempre uma execução ativa e atempada, sendo a maioria dos trabalhos realizados com mão de obra efetiva dos operacionais da Junta de Freguesia.

Conjuntamente, deixamos também algumas fotos ilustrativas dos trabalhos realizados.


MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COM BETUMINOSO A FRIO



PARQUES




ECO TRILHO

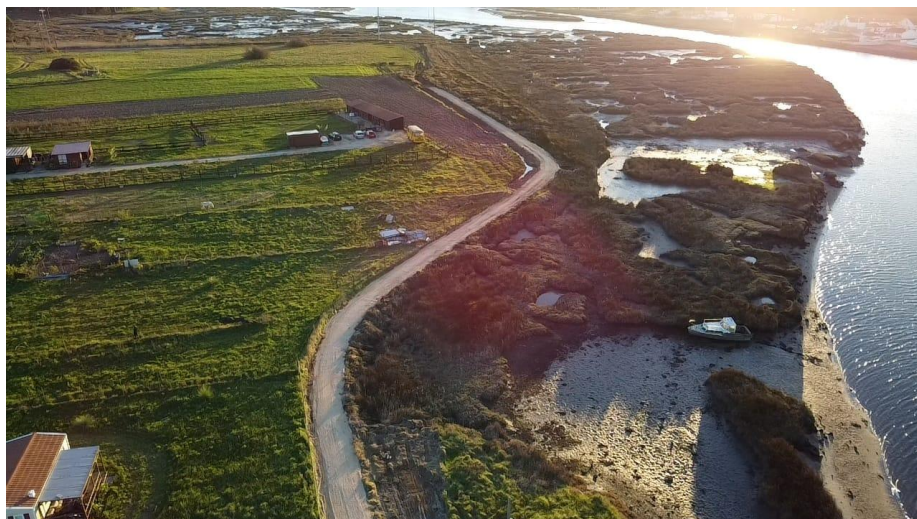


MANUTENÇÃO DE CAMINHOS



LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS HIDRAULICAS

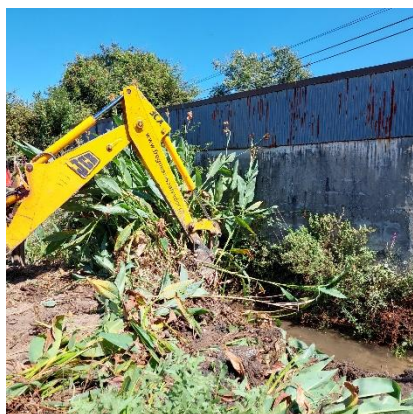

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DO MERCADO DE ÍLHAVO

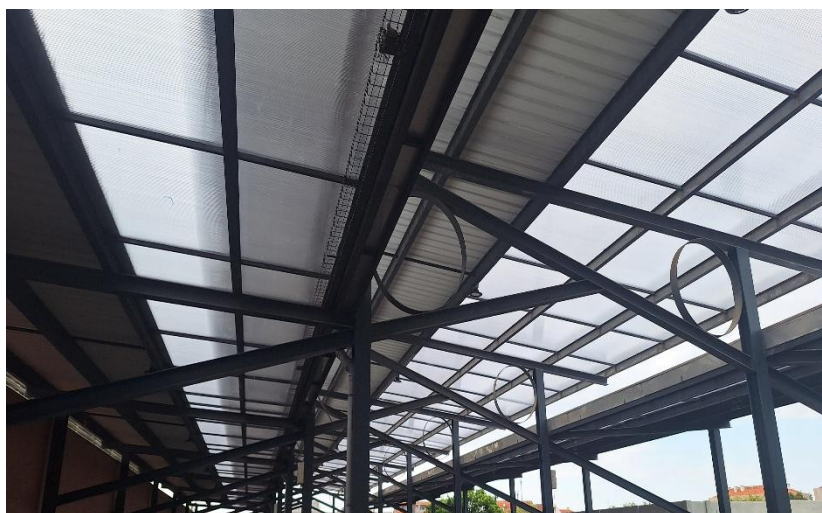

APLICAÇÃO DE NOVAS ÁRVORES



SINALÉTICA



CEMITÉRIOS




PASSEIOS E CONSTRUÇÃO DE BASES ERSUCS



Ílhavo, 04 de agosto de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia de S.
Salvador,

A handwritten signature in black ink, reading "João Eduardo Bonito Braga". The signature is fluid and cursive, with the first name "João" starting with a large 'J' and the last name "Braga" ending with a long horizontal stroke.

João Eduardo Bonito Braga

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

João José Almeida Gonçalves



Ribas, 1
3830-221 Ílhavo
Tel. e Fax : 234 321 450
Telemovel 965026881

Todo o Tipo de Caleiras
Mail : joaoaleiras@hotmail.com

Fatura

FT FT23/76

Original

João José Almeida Gonçalves

NIF: 142658766

Rua Ribas nº 1

3830-221 ÍLHAVO

Portugal

JUNTA de FREGUESIA de ILHAVO (S.
SALVADOR)

AV. 25 Abril Ilhavo

3830-044 ILHAVO

Nº	Contribuinte	Data
00080	510833217	2025-05-19

CXCC-Processado por programa certificado n.º 2340/AT - www.solria.pt

Código	Descrição	Qt.	Desc.	IVA%	P. Unitário	Total
00.06.06	PLACA THERMOCLER CRITAL 16MM	1,00		23	24.390,00	24.390,00

Impostos

%	Líquido	Valor
23	24.390,00	5.609,70

ATCUD:JFMBZTBW-76



Totais

Valor	24.390,00 €
Desconto	0,00 €
Imposto	5.609,70 €
Total	29.999,70 €

Carga: 2025-05-19 15:18 Rua Ribas nº 1, 3830-221 ÍLHAVO

Descarga: AV. 25 Abril Ilhavo 3830-044 ILHAVO

NIB: 0035 0372 0001 0610 70077

IBAN: PT50 0035 0372 0001 0610 70077

BIC/SWIFT: .

ATCUD:JFMBZTBW-76
